


















































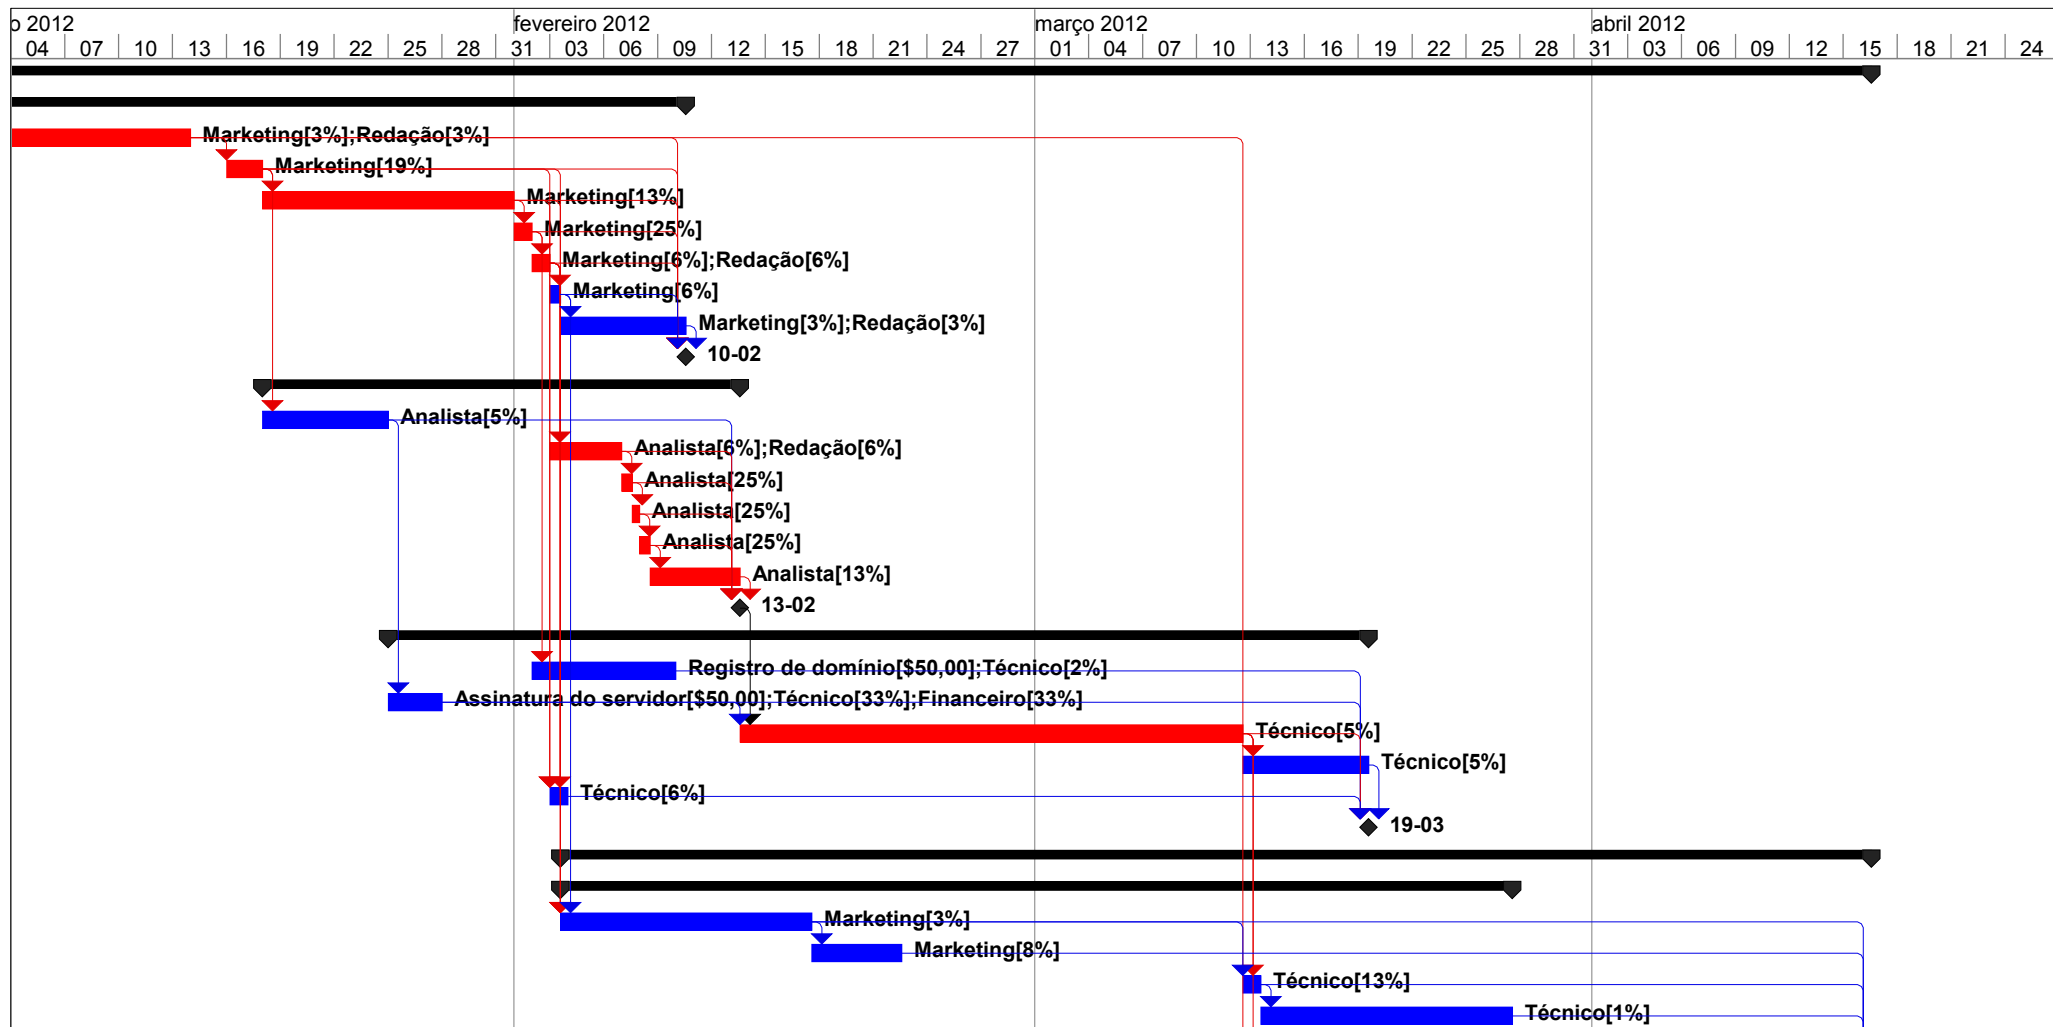
ID	Nome da tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	26	29	janeiro 20
1	Projeto - Montar um blog	75,5 dias	Seg 02-01-12	Seg 16-04-12					01 04
2	Concepção	29,5 dias	Seg 02-01-12	Sex 10-02-12					
3	Definir tema	10 dias	Seg 02-01-12	Sex 13-01-12		Marketing[3%];Redação[3%]			
4	Definir Nome do blog	2 dias	Seg 16-01-12	Ter 17-01-12	3	Marketing[19%]			
5	Definir diretrizes da "marca"	10 dias	Qua 18-01-12	Ter 31-01-12	4	Marketing[13%]			
6	Definir Nome do domínio	1 dia	Qua 01-02-12	Qua 01-02-12	5	Marketing[25%]			
7	Definir tópicos	1 dia	Qui 02-02-12	Qui 02-02-12	6	Marketing[6%];Redação[6%]			
8	Definir periodicidade das postagens	0,5 dias	Sex 03-02-12	Sex 03-02-12	7	Marketing[6%]			
9	Estabelecer guias para os tópicos	5 dias	Sex 03-02-12	Sex 10-02-12	8	Marketing[3%];Redação[3%]			
10	[1] Blog concebido	0 dias	Sex 10-02-12	Sex 10-02-12	9;3;4;5;6;7;8				
11	Elaboração	18,5 dias	Qua 18-01-12	Seg 13-02-12					
12	Definir servidor	5 dias	Qua 18-01-12	Ter 24-01-12	4	Analista[5%]			
13	Definir mapa do site	2 dias	Sex 03-02-12	Seg 06-02-12	7	Analista[6%];Redação[6%]			
14	Definir template	0,5 dias	Ter 07-02-12	Ter 07-02-12	13	Analista[25%]			
15	Definir layout	0,5 dias	Ter 07-02-12	Ter 07-02-12	14	Analista[25%]			
16	Definir paleta de cores	0,5 dias	Qua 08-02-12	Qua 08-02-12	15	Analista[25%]			
17	Definir widgets	3 dias	Qua 08-02-12	Seg 13-02-12	16	Analista[13%]			
18	[2] Blog elaborado	0 dias	Seg 13-02-12	Seg 13-02-12	17;12;13;14;15;16				
19	Construção	38,5 dias	Qua 25-01-12	Seg 19-03-12					
20	Registrar domínio [custo fixo]	6 dias	Qui 02-02-12	Qui 09-02-12	6	Registro de domínio[\$50,00];Técnico[2%]			
21	Assinar servidor [custo fixo]	3 dias	Qua 25-01-12	Sex 27-01-12	12	Assinatura do servidor[\$50,00];Técnico[33%];Financeiro[33%]			
22	Construir site no servidor escolhido	20 dias	Seg 13-02-12	Seg 12-03-12	21;18	Técnico[5%]			
23	Configurar e-mail no domínio	5 dias	Seg 12-03-12	Seg 19-03-12	22	Técnico[5%]			
24	Criar twitter do blog	1 dia	Sex 03-02-12	Sex 03-02-12	4;5;7	Técnico[6%]			
25	[3] Blog no ar	0 dias	Seg 19-03-12	Seg 19-03-12	24;20;21;22;23				
26	Transição	51 dias	Sex 03-02-12	Seg 16-04-12					
27	Colunistas	37 dias	Sex 03-02-12	Ter 27-03-12					
28	Convidar colunistas	10 dias	Sex 03-02-12	Sex 17-02-12	4;5;7;8	Marketing[3%]			
29	Passar instruções sobre o tema	3 dias	Sex 17-02-12	Qua 22-02-12	28	Marketing[8%]			
30	Prover acesso aos participantes	1 dia	Seg 12-03-12	Ter 13-03-12	22;28	Técnico[13%]			
31	Solicitar currículo dos colunistas	10 dias	Ter 13-03-12	Ter 27-03-12	30	Técnico[1%]			

Projeto: Projeto BLOG
Data: Seg 08-12-14

Tarefa		Divisão		Resumo da Agregação Manual	
Tarefa crítica		Tarefas externas		Resumo Manual	
Etapas		Resumo do projeto		Apenas início	
Resumo		Agrupar por resumo		Apenas-conclusão	
Tarefa acumulada		Marco Inativo		Tarefas Externas	
Tarefa crítica acumulada		Resumo Inativo		Marco Externo	
Etapas acumuladas		Tarefa Manual		Andamento	
Andamento acumulado		Apenas-duração		Data limite	

ID	 Nome da tarefa	Duração	Início	Conclusão	Predecessoras	Nomes de Recursos	26	29	janeiro 20
32	Edição de artigos	5 dias	Seg 12-03-12	Seg 19-03-12					01
33	Escrever artigo inicial	5 dias	Seg 12-03-12	Seg 19-03-12	3;22	Redação[20%]			04
34	Divulgação	20 dias	Seg 19-03-12	Seg 16-04-12					
35	Enviar e-mails	5 dias	Seg 19-03-12	Seg 26-03-12	33	Marketing[10%]			
36	Divulgar no twitter	20 dias	Seg 19-03-12	Seg 16-04-12	33	Marketing[9%]			
37	Acrescentar palavras-chave	5 dias	Seg 19-03-12	Seg 26-03-12	33	Redação[8%]			
38	[4] Projeto do Blog concluído	0 dias	Seg 16-04-12	Seg 16-04-12	28;29;30;31;35;36;37;33				

Projeto: Projeto BLOG Data: Seg 08-12-14	Tarefa		Divisão		Resumo da Agregação Manual	
	Tarefa crítica		Tarefas externas		Resumo Manual	
	Etapas		Resumo do projeto		Apenas início	
	Resumo		Agrupar por resumo		Apenas-conclusão	
	Tarefa acumulada		Marco Inativo		Tarefas Externas	
	Tarefa crítica acumulada		Resumo Inativo		Marco Externo	
	Etapas acumuladas		Tarefa Manual		Andamento	
	Andamento acumulado		Apenas-duração		Data limite	



Tarefa		Divisão		Resumo da Agregação Manual	
Tarefa crítica		Tarefas externas		Resumo Manual	
Etapas		Resumo do projeto		Apenas início	
Resumo		Agrupar por resumo		Apenas-conclusão	
Tarefa acumulada		Marco Inativo		Tarefas Externas	
Tarefa crítica acumulada		Resumo Inativo		Marco Externo	
Etapas acumuladas		Tarefa Manual		Andamento	
Andamento acumulado		Apenas-duração		Data limite	



Projeto: Projeto BLOG Data: Seg 08-12-14	Tarefa		Divisão		Resumo da Agregação Manual	
	Tarefa crítica		Tarefas externas		Resumo Manual	
	Etapas		Resumo do projeto		Apenas início	
	Resumo		Agrupar por resumo		Apenas-conclusão	
	Tarefa acumulada		Marco Inativo		Tarefas Externas	
	Tarefa crítica acumulada		Resumo Inativo		Marco Externo	
	Etapas acumuladas		Tarefa Manual		Andamento	
	Andamento acumulado		Apenas-duração		Data limite	
